





รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
กรมการขนส่งทางบก  
(ไตรมาสที่ ๑ : ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)

กลุ่มติดตามและประเมินผล  
กองแผนงาน  
มกราคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมการขนส่งทางบก  
ประจำไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)

แผนปฏิบัติราชการ	จำนวนโครงการ / ผลการดำเนินงาน			
	จำนวนโครงการ	แล้วเสร็จ	ตามแผน	ล่าช้า
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑	๑๒	๑	๑๐	๑
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒	๗	๐	๗	๐
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓	๑๐	๐	๑๐	๐
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔	๑	๐	๑	๐
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๕	๓๒	๐	๑๕	๑๗
รวมทั้งสิ้น	๖๒	๑	๔๓	๑๘

■ โครงการทั้งหมด ■ แล้วเสร็จ ■ ตามแผน ■ ล่าช้า

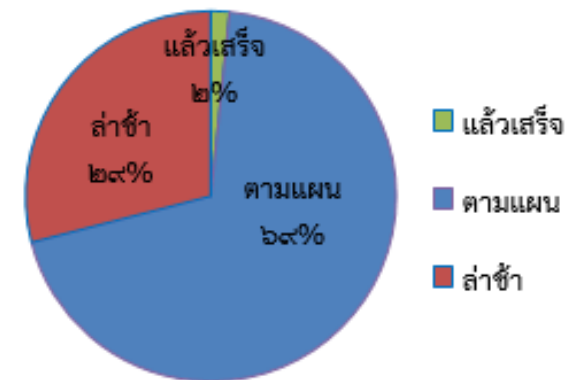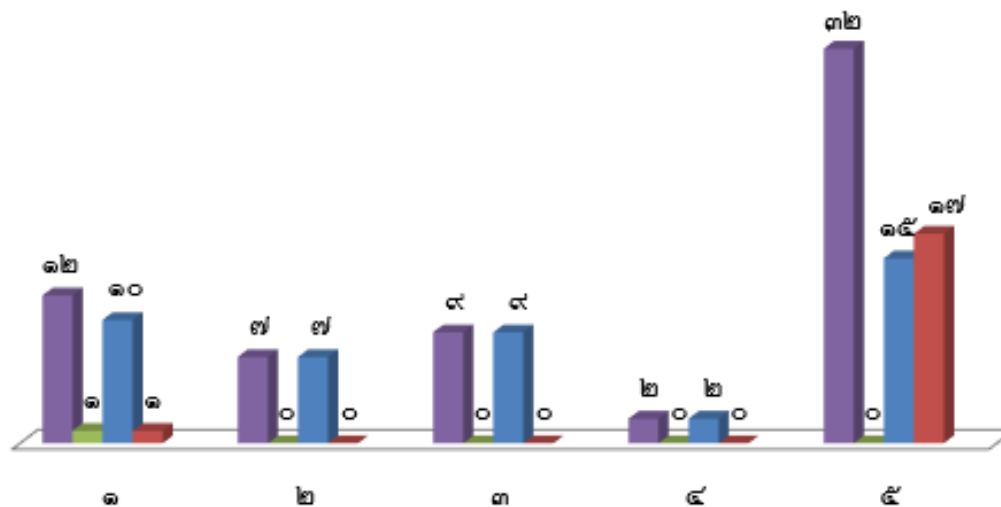

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมการขนส่งทางบก  
ประจำไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)

แผนปฏิบัติการ	จำนวนแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน		
		แล้วเสร็จ	ตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน (ล่าช้า)
<b>แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ : “ปฏิรูปทั้งระบบ”</b> เพื่อให้ระบบการขนส่งสาธารณะมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน	๑๒	๑	๑๐	๑
- การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน	๑๑	-	๑๐	๑
- การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	๑	๑	-	-
<b>แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ : “สานต่อความสำเร็จ”</b> เพื่อให้ระบบการขนส่งสินค้ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และแข่งขันได้	๗	-	๗	-
- การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน	๓	-	๓	-
- การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	๔	-	๔	-
<b>แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ : “เดินหน้าทุกด้าน ทุกพื้นที่ อย่างมีส่วนร่วม”</b> เพื่อให้ระบบขนส่งทางถนนมีความปลอดภัย	๑๐	-	๑๐	-
- การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับการดูแลการขนส่งทางถนน	๑๐	-	๑๐	-
<b>แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ : “สร้างมาตรฐานใหม่ตามสากล”</b> เพื่อให้ระบบการขนส่งทางถนนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	๑	-	๑	-
- การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับการดูแลการขนส่งทางถนน	๑	-	๑	-
<b>แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๕ : “ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น”</b> เพื่อให้การให้บริการที่เป็นเลิศและการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม	๓๒	-	๑๕	๑๗
- การพัฒนาการให้บริการประชาชน	๑๙	-	๘	๑๑
- การพัฒนาบุคลากรของกรมการขนส่งทางบก	๖	-	๖	-
- การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๗	-	๑	๖
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๖๒</b>	<b>๑</b>	<b>๔๓</b>	<b>๑๘</b>

## สารบัญ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน้า
<b>แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๑ “ปฏิรูปทั้งระบบ”</b> เพื่อให้ระบบการขนส่งสาธารณะมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน/การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์		
๑	โครงการจัดทำข้อมูลการเดินทางโดยสารประจำทางเพื่อการวางแผนการเดินทาง	๑
๒	โครงการค่าศึกษารูปแบบการอุดหนุนของรัฐที่ยั่งยืนในระบบรถโดยสารสาธารณะ	๑
๓	โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ ๒ ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (งบผูกพัน)	๒
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร	๒
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรถรับจ้าง (รถแท็กซี่)	๒
๖	โครงการแนะแนวแก้ไขปัญหาการประกอบการขนส่งประจำทางเชิงรุก	๒-๓
๗	โครงการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทาง (Q-Mark)	๓
๘	โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้ประกอบการขนส่งรุ่นใหม่	๔
๙	โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารในส่วนภูมิภาค	๔
๑๐	แผนงานสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ	๔
๑๑	โครงการรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus)	๔-๕
๑๒	แผนงานโครงข่ายเส้นทางและเงื่อนไขการเดินทางประจำทาง	๕
<b>แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ “สานต่อความสำเร็จ”</b> เพื่อให้ระบบการขนส่งสินค้ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และแข่งขันได้ การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน/การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์		
๑๓	ค่าจ้างที่ปรึกษายกระดับแผนพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) รองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	๕-๖
๑๔	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจัดการขนส่งสินค้าทางถนน เพื่อช่วยสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศไทย	๖
๑๕	โครงการพัฒนาระบบการควบคุมกำกับดูแลการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน	๖
๑๖	โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain Logistics)	๖-๗
๑๗	โครงการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก	๗

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน้า
๑๘	โครงการติดตามความก้าวหน้าด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ	๗-๘
๑๙	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ	๘
<b>แผนปฏิบัติการราชการเรื่องที่ ๓ “เดินหน้าทุกด้าน ทุกพื้นที่ อย่างมีส่วนร่วม” เพื่อให้ระบบขนส่งทางถนนมีความปลอดภัย</b> <b>การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน</b>		
๒๐	โครงการตรวจสอบกำกับ และดูแลการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	๘
๒๑	โครงการตรวจเข้มชั้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๙
๒๒	โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐
๒๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐-๑๑
๒๔	โครงการตรวจสอบ ติดตาม และกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงเรียนสอนขับรถในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๑-๑๒
๒๕	โครงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทางถนน	๑๒
๒๖	โครงการกำกับดูแลผู้ตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง	๑๒
๒๗	โครงการประชุมผู้เชี่ยวชาญแห่งเอเชีย	๑๓
๒๘	โครงการผลิตสื่อและนิทรรศการ ให้ความรู้สร้างเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	๑๓
๒๙	โครงการติดตามและประเมินผลโครงการด้านความปลอดภัยทางถนน	๑๓
<b>แผนปฏิบัติการราชการเรื่องที่ ๔ “สร้างมาตรฐานใหม่ตามสากล” เพื่อให้ระบบการขนส่งทางถนนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</b> <b>การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน</b>		
๓๐	โครงการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและเสียงรบกวน	๑๓-๑๔
<b>แผนปฏิบัติการราชการเรื่องที่ ๕ “ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น” เพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศและการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม</b> <b>พัฒนาการให้บริการประชาชน</b>		
๓๑	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ท่าบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม (ทดแทน)	๑๔
๓๒	โครงการก่อสร้างสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ท่าบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (ทดแทน)	๑๔

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน้า
๓๓	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลรูสมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี (ทดแทน)	๑๕
๓๔	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (งบบุคลากร)	๑๕
๓๕	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด ๑๒ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง สาขาอำเภอแกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๑๕
๓๖	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร ๔ กรมการขนส่งทางบก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	๑๖
๓๗	โครงการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าสำนักงานขนส่งจังหวัด ๒๘ แห่ง	๑๖
๓๘	โครงการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอ ๕๒ แห่ง	๑๖
๓๙	โครงการปรับปรุงอาคารชั้นที่ ๑, ๒ และหลังคาอาคาร สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร	๑๖
๔๐	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร	๑๖
๔๑	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด ๑๖ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์ทดสอบยานยนต์ จังหวัดปทุมธานี	๑๗
๔๒	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	๑๗
๔๓	โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านแฝด) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๕ แห่ง	๑๗
๔๔	โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑๗
๔๕	โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ๙ แห่ง	๑๗
๔๖	โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	๑๗
๔๗	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด ๓๒ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร	๑๘
๔๘	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ๓๐ แห่ง	๑๘
๔๙	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานขนส่งสาขา ๕ แห่ง	๑๘
<b>การพัฒนาศูนย์กลางของกรมการขนส่งทางบก</b>		
๕๐	แผนพัฒนาศูนย์กลางกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๘-๑๙

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน้า
๕๑	โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมการขนส่งทางบก และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ แผนรายปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๙
๕๒	แผนงานพัฒนาระบบราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๙-๒๑
๕๓	แผนการดำเนินการเสนอขอรับรางวัลของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๑
๕๔	แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๑
๕๕	โครงการพัฒนางานบริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของกรมการขนส่งทางบกสู่ดิจิทัล	๒๒
<b>การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		
๕๖	โครงการพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตขับรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและรองรับการพัฒนาไปสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ	๒๒
๕๗	โครงการพัฒนาระบบบริการทางทะเบียนรถรูปแบบดิจิทัล แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ	๒๒
๕๘	โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัลของกรมการขนส่งทางบก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ	๒๓
๕๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ภัยคุกคาม ทางไซเบอร์ กรมการขนส่งทางบก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ	๒๓
๖๐	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการหน่วยงานในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาคของกรมการขนส่งทางบก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ	๒๓
๖๑	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Passbook ทดแทนเครื่องพิมพ์เครื่องเก่าและเพิ่มเติม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๘๘ เครื่อง	๒๓
๖๒	โครงการจัดหาระบบป้องกันไฟฟ้ากระชอกทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพของสำนักงานขนส่ง ระยะที่ ๔ จำนวน ๔๓ แห่ง	๒๔

รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมการขนส่งทางบก  
ประจำไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)  
จำนวน ๖๒ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของนี้้งงาน/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ “ปฏิรูปทั้งระบบ” เพื่อให้ระบบการขนส่งสาธารณะมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน (จำนวน ๑๒ แผนงาน/โครงการ)								
การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน/การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์								
๑	โครงการจัดทำข้อมูล การเดินทางโดยสารประจำทาง เพื่อการวางแผนการเดินทาง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. จัดทำร่างขอบเขต ของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในสัญญาจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘)	เป็นไปตามแผน ๑. จัดทำร่าง TOR และกำหนด ราคากลาง แล้วเสร็จ ๒. จัดตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หมายเหตุ : ยกเลิกการดำเนินการ จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำข้อมูล การเดินทางโดยสารประจำทางฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ประกอบด้วยเอกสารไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ ได้รายงาน ผลการพิจารณาการจ้างที่ปรึกษา ก่อนดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา ในครั้งถัดไป	๕.๐๐	งบรายจ่ายอื่น ๒๘,๗๐๐,๐๐๐	-	-
๒	โครงการค่าศึกษารูปแบบการอุดหนุน ของรัฐที่ยั่งยืนในระบบโดยสารสาธารณะ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. การจัดทำร่างขอบเขต ของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ดำเนินการจัดจ้าง และลงนามในสัญญา จำนวน ๑ ฉบับ (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	ไม่เป็นไปตามแผน ๑. จัดทำร่าง TOR และกำหนด ราคากลาง แล้วเสร็จ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง ที่ปรึกษา ครั้งที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก	๕.๐๐	งบรายจ่ายอื่น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	ล่าช้าในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอ เพียงรายเดียว และ คณะกรรมการจ้าง ที่ปรึกษาพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ยกเลิก การจัดจ้าง ส่งผลให้ การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข								
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง									
๓	โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ ๒ ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (งบผูกพัน)	ต.ค.๖๓-ม.ค.๖๘ (ยกเลิกสัญญาเดิม)	๑. ส่งมอบงานก่อสร้าง จำนวน ๑ งวดงาน ๒. พิจารณาตรวจรับงาน จำนวน ๑ ครั้ง ๓. เบิกจ่ายเงินส่วนที่เหลือ ตามสัญญา (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	<b>เสร็จสิ้นโครงการ</b> ๑. ลงนามสัญญาจ้าง บริษัท ไทรนิคอด ซิสเต็มส์ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ วงเงิน ๕๙.๕๒ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ ๒. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้าย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ประชุมตรวจรับงาน พร้อม เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างประสานการถ่ายโอน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มหาสารคาม (อบจ.มหาสารคาม)	๑๐๐.๐๐	<b>งบลงทุน</b> วงเงินรวม : ๘๙,๕๖๐,๗๐๐ <table border="1"> <tr> <td>งบปี ๖๔ - ๖๕</td> <td>๒๙,๙๙๙,๗๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๖</td> <td>๘,๕๕๔,๔๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๗</td> <td>๑๘,๓๕๒,๔๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๘</td> <td>๓๒,๖๕๔,๒๐๐</td> </tr> </table>	งบปี ๖๔ - ๖๕	๒๙,๙๙๙,๗๐๐	งบปี ๖๖	๘,๕๕๔,๔๐๐	งบปี ๖๗	๑๘,๓๕๒,๔๐๐	งบปี ๖๘	๓๒,๖๕๔,๒๐๐	๕๙,๕๒๐,๐๐๐	-
งบปี ๖๔ - ๖๕	๒๙,๙๙๙,๗๐๐															
งบปี ๖๖	๘,๕๕๔,๔๐๐															
งบปี ๖๗	๑๘,๓๕๒,๔๐๐															
งบปี ๖๘	๓๒,๖๕๔,๒๐๐															
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง ด้วยรถโดยสาร	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ประชุมหารือเพื่อหาหัวข้อ และรายละเอียดการสัมมนา ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘)	<b>เป็นไปตามแผน</b> - อยู่ระหว่างการดำเนินการหารือ เพื่อหาหัวข้อในการจัดสัมมนา	-	<b>งบดำเนินงาน</b> ๓๐,๐๐๐	-	-								
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการรถรับจ้าง (รถแท็กซี่)	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ประชุมหารือเพื่อหาหัวข้อ และรายละเอียดในการ ให้ความรู้ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘)	<b>เป็นไปตามแผน</b> - อยู่ระหว่างการเตรียมการประชุมหารือ เพื่อกำหนดหัวข้อในการจัดสัมมนา	-	<b>งบดำเนินงาน</b> ๓๐,๐๐๐	-	-								
๖	โครงการแนะแนวแก้ไขปัญหา การประกอบการขนส่งประจำทาง เชิงรุก	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. ตรวจสอบและศึกษา การเปลี่ยนแปลงของประวัติ การประกอบการขนส่ง ของผู้ประกอบการขนส่ง จำนวน ๔ ครั้ง ๒. คัดเลือกผู้ประกอบการขนส่ง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔ ครั้ง	<b>เป็นไปตามแผน</b> - อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของประวัติ การประกอบการขนส่ง และคัดเลือก ผู้ประกอบการขนส่งกลุ่มเป้าหมาย	-	<b>งบดำเนินงาน</b> ๒๐๐,๐๐๐	-	-								

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
			๓. กำหนดรายละเอียด ประเด็นปัญหา ของผู้ประกอบการขนส่ง จัดเตรียมข้อมูลเอกสาร และกำหนดแผนงาน ออกตรวจเยี่ยม จำนวน ๔ ครั้ง ๔. ออกตรวจเยี่ยม ผู้ประกอบการขนส่ง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔ ครั้ง ๕. จัดประชุม/สัมมนา จำนวน ๑ ครั้ง (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘)					
๗	โครงการรับรองมาตรฐานคุณภาพ บริการรถโดยสารประจำทาง (Q-Mark)	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. การชักซ้อม การตรวจประเมิน มาตรฐานคุณภาพบริการ รถโดยสารประจำทาง จำนวน ๑ ครั้ง ๒. การให้ความรู้เกี่ยวกับ ข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ บริการรถโดยสารประจำทาง แก่ผู้ประกอบการขนส่ง จำนวน ๑ ครั้ง ๓. การออกตรวจติดตาม มาตรฐานคุณภาพบริการ รถโดยสารประจำทาง จำนวน ๑ ครั้ง (ดำเนินการระหว่างเดือน ธ.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘)	เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการประสานงานและ วางแผนการตรวจประเมินมาตรฐาน คุณภาพบริการรถโดยสารประจำทาง ให้กับบริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด และบริษัท เทพสมบัติ จำกัด - เตรียมออกตรวจติดตามมาตรฐาน คุณภาพบริการรถโดยสารประจำทาง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด มาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสาร ประจำทางแก่ผู้ประกอบการขนส่ง และตรวจติดตามประจำปี โดยมี กำหนดการตรวจติดตามทั้งหมด ๑๓ เส้นทาง ๒ บริษัท คือ บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด และ บริษัท เทพสมบัติ จำกัด	-	<u>งบดำเนินงาน</u> ๑๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
๘	โครงการส่งเสริมคุณภาพ ผู้ประกอบการขนส่งรุ่นใหม่	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	จัดทำแผนการศึกษาดูงาน/ อบรม/สัมมนา จำนวน ๑ ฉบับ (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	เป็นไปตามแผน ๑. จัดทำแผนการศึกษาดูงาน/ อบรม/สัมมนา แล้วเสร็จ ๒. อยู่ระหว่างประสาน การหาความต้องการในการฝึกอบรม ของผู้ประกอบการขนส่ง	๑๕.๐๐	<u>งบดำเนินงาน</u> ๘๐,๐๐๐	-	-
๙	โครงการพัฒนาและส่งเสริม ผู้ประกอบการขนส่ง ด้วยรถโดยสารในส่วนภูมิภาค	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	จัดทำหนังสือถึงสำนักงาน ขนส่งจังหวัด ให้จัดทำ แผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาและส่งเสริม ผู้ประกอบการขนส่ง ในส่วนภูมิภาคและ ดำเนินการตามแผนที่กำหนด จำนวน ๑ ฉบับ (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	เป็นไปตามแผน - จัดทำหนังสือแจ้งสำนักงาน ขนส่งจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัดให้จัดทำ แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนา และส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งฯ เรียบร้อยแล้ว	๑๐.๐๐	<u>งบดำเนินงาน</u> ๗๖๐,๐๐๐	-	-
๑๐	แผนงานสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนผู้ใช้บริการ รถโดยสารสาธารณะ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. จัดทำแผนการสำรวจ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. สร้างเครื่องมือสำรวจ จำนวน ๑ ชุด (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	เป็นไปตามแผน ๑. จัดทำแผนการสำรวจและ สร้างเครื่องมือสำรวจ ๒. แจกเวียนทุกจังหวัดให้ดำเนินการ สำรวจความพึงพอใจ ๓. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ สำรวจความพึงพอใจ	๑๐.๐๐	<u>งบดำเนินงาน</u> ๑๒,๐๐๐	-	-
๑๑	โครงการรับรองมาตรฐานคุณภาพ รถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus)	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. การให้ความรู้ ผู้ประกอบการขนส่ง เกี่ยวกับข้อกำหนด และ เกณฑ์การประเมิน มาตรฐานคุณภาพ รถโดยสารสาธารณะ เพื่อแนะนำและเชิญชวน ให้ยื่นขอรับรองมาตรฐาน คุณภาพรถโดยสารสาธารณะ จากกรมการขนส่งทางบก จำนวน ๒ ครั้ง	เป็นไปตามแผน ๑. ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการขนส่ง ที่สนใจรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ รถโดยสารสาธารณะ จำนวน ๓ ครั้ง ๒. ออกตรวจประเมินมาตรฐาน คุณภาพรถโดยสารสาธารณะ จำนวน ๕ ครั้ง	๔๕.๐๐	<u>งบดำเนินงาน</u> ๑๘๔,๐๐๐	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
			๒. การออกตรวจประเมิน มาตรฐานคุณภาพ รถโดยสารสาธารณะ จำนวน ๓ ครั้ง (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)					
๑๒	แผนงานโครงข่ายเส้นทางและเงื่อนไข การเดินทางประจำทาง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. สํารวจข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพทาง ระยะทาง สภาพแวดล้อมต่าง ๆ และ ความต้องการของประชาชน ในการเดินทางด้วยระบบ ขนส่งทางสาธารณะทางถนน ไม่น้อยกว่า ๑๒ ครั้ง (๓ ครั้ง/ ไตรมาส) ๒. จัดทำวาระการประชุม เสนอคณะอนุกรรมการ พิจารณการขนส่งทางบกกลาง และหรือคณะกรรมการ ควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เพื่อพิจารณา ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เส้นทาง (๓๕ เส้นทาง/ ไตรมาส) (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	เป็นไปตามแผน ๑. ออกสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทาง ระยะทาง สภาพแวดล้อมต่าง ๆ จำนวน ๔ ครั้ง ๒. จัดทำวาระการประชุม คณะอนุกรรมการฯ และหรือ คณะกรรมการควบคุมการขนส่ง ทางบกกลาง เพื่อพิจารณา จำนวน ๗๐ เส้นทาง - กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทาง การเดินทางโดยสารประจำทาง จำนวน ๓๑ เส้นทาง - กำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไข การเดินทางโดยสารประจำทาง จำนวน ๓๙ เส้นทาง	๔๑.๖๖	<b>งบดำเนินงาน</b> ๓๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๖๕	-
<b>แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๒ “สานต่อความสำเร็จ” เพื่อให้ระบบการขนส่งสินค้ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และแข่งขันได้ (จำนวน ๗ โครงการ/กิจกรรม)</b>								
การพัฒนากระบวนการขนส่งทางถนน/การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์								
๑๓	ค่าจ้างที่ปรึกษายกระดับแผนพัฒนา สถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) รองรับการเชื่อมโยงโครงข่าย โครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ ของประเทศ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กระบวนการจัดจ้าง ที่ปรึกษา (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก ได้มีหนังสือเชิญ ให้ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด (สถาบันการศึกษาของรัฐ) จำนวน ๑๔ ราย เข้ายื่นข้อเสนอ	-	<b>งบลงทุน</b> ๒๔,๘๘๗,๐๐๐	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข						
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง							
				โดยกำหนดยื่นข้อเสนอ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘										
๑๔	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจัดการขนส่งสินค้าทางถนน เพื่อช่วยสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศไทย (งบผูกพัน)	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	การวิเคราะห์ระบบงาน - วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ - การวิเคราะห์แนวทางการดำเนินงาน (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	เป็นไปตามแผน มีการประชุมตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อพิจารณาแผนงานและรายงานเริ่มต้นการศึกษาของที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗	๑๕.๐๐	<b>งบลงทุน</b> งบเงินรวม : ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ <table border="1"> <tr> <td>งบปี ๖๗</td> <td>๑๐,๐๕๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๘</td> <td>๒๗,๙๕๗,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๙</td> <td>๒๙,๐๐๓,๐๐๐</td> </tr> </table>	งบปี ๖๗	๑๐,๐๕๐,๐๐๐	งบปี ๖๘	๒๗,๙๕๗,๐๐๐	งบปี ๖๙	๒๙,๐๐๓,๐๐๐	๑๒,๕๑๔,๓๐๐	-
งบปี ๖๗	๑๐,๐๕๐,๐๐๐													
งบปี ๖๘	๒๗,๙๕๗,๐๐๐													
งบปี ๖๙	๒๙,๐๐๓,๐๐๐													
๑๕	โครงการพัฒนาระบบการควบคุมกำกับดูแลการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน (งบผูกพัน)	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑. พัฒนานองค์ความรู้ การขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนระหว่างประเทศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่ง ๒. ศึกษาแนวทางการกำกับดูแลการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมการขนส่งทางบก (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	เป็นไปตามแผน ๑. ดำเนินโครงการนำร่องการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อจัดให้มีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน (DG-TSM) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัดชลบุรี ๒. ส่งมอบรายงานชิ้นกลาง (Interim Report) งวดที่ ๒ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมตรวจรับงานพร้อมเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	๖๓.๐๐	<b>งบลงทุน</b> งบเงินรวม : ๒๘,๑๑๓,๐๐๐ <table border="1"> <tr> <td>งบปี ๖๗</td> <td>๔,๕๐๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๘</td> <td>๒๑,๙๕๗,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๙</td> <td>๑,๖๖๖,๐๐๐</td> </tr> </table>	งบปี ๖๗	๔,๕๐๐,๐๐๐	งบปี ๖๘	๒๑,๙๕๗,๐๐๐	งบปี ๖๙	๑,๖๖๖,๐๐๐	๑๗,๗๑๑,๑๕๐	-
งบปี ๖๗	๔,๕๐๐,๐๐๐													
งบปี ๖๘	๒๑,๙๕๗,๐๐๐													
งบปี ๖๙	๑,๖๖๖,๐๐๐													
๑๖	โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain Logistics) (งบผูกพัน)	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ - ความร่วมมือจัดทำโครงการนำร่อง ๑ โครงการ (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	เป็นไปตามแผน ๑. จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain logistics) ๒. ศึกษาเส้นทางการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ในเส้นทาง R3A ๓. ประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคิน ทรานสปอร์ต ในการตรวจประเมินมาตรฐาน Q-Mark	๕๐.๐๐	<b>งบรายจ่ายอื่น</b> งบเงินรวม : ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ <table border="1"> <tr> <td>งบปี ๖๗</td> <td>๓,๓๕๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๘</td> <td>๑๙,๘๖๒,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๙</td> <td>๑,๗๘๘,๐๐๐</td> </tr> </table>	งบปี ๖๗	๓,๓๕๐,๐๐๐	งบปี ๖๘	๑๙,๘๖๒,๐๐๐	งบปี ๖๙	๑,๗๘๘,๐๐๐	๑๐,๑๒๐,๙๕๐	-
งบปี ๖๗	๓,๓๕๐,๐๐๐													
งบปี ๖๘	๑๙,๘๖๒,๐๐๐													
งบปี ๖๙	๑,๗๘๘,๐๐๐													

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
				และ Q-Cold Chain ๔. ตรวจสอบมาตรฐาน Q-Cold Chain บริษัท ไอซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ๕. อยู่ระหว่างการกำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ร่างมาตรฐานการขนส่งยาเวชภัณฑ์ และพัสดุภัณฑ์แบบควบคุมอุณหภูมิ" และการประชุมตรวจรับ Interim report				
๑๗	โครงการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. ตรวจสอบผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q-Mark) จำนวน ๑ ครั้ง ๒. การประชาสัมพันธ์มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก จำนวน ๑ ครั้ง (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	เป็นไปตามแผน ๑. ตรวจสอบผู้ประกอบการขนส่งที่ได้ Q-Mark จำนวน ๑ ครั้ง ๒. ออกบูชประชาสัมพันธ์มาตรฐานฯ จำนวน ๒ ครั้ง	๖.๒๕	<u>งบดำเนินงาน</u> ๓๕๐,๐๐๐	๑๖,๕๐๐	-
๑๘	โครงการติดตามความก้าวหน้าด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. พิจารณาการดำเนินการภายใต้ความตกลงด้านภวณขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ ตั้งค่าเป้าหมายและจัดลำดับความสำคัญประเด็นที่สมควรแก่การติดตาม จำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดการประชุมหารือ/สำรวจ/เก็บข้อมูล ในพื้นที่จังหวัดที่สำคัญหรือมีความเกี่ยวข้องโดยตรง จำนวน ๑ ครั้ง ๓. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน การบังคับใช้	เป็นไปตามแผน ๑. พิจารณาการดำเนินการภายใต้ความตกลงฯ ๒. ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการเดินทางโดยสารประจำทางระหว่างประเทศ สายที่ ๕ จังหวัดขอนแก่น - นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการเดินทางโดยสารในเส้นทางดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ๓. อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจเส้นทางฯ	๓๐.๐๐	<u>งบดำเนินงาน</u> ๘๙,๖๒๐	๑๙,๕๓๙.๑๒	-

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
			และพิจารณาหาแนวทาง เพื่อการพัฒนาต่อไป จำนวน ๑ ครั้ง (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘)					
๑๙	โครงการพัฒนาและส่งเสริม การดำเนินการขนส่งทางถนน ระหว่างประเทศ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	พิจารณาทิศทางการนโยบาย ข้อมูล และการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้อง ณ ปัจจุบัน จำนวน ๑ ครั้ง (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘)	เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณา ทิศทางนโยบายฯ	-	<b>งบดำเนินงาน</b> ๙๘,๗๓๐	-	-
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๓ “เดินหน้าทุกด้าน ทุกพื้นที่ อย่างมีส่วนร่วม” เพื่อให้ระบบขนส่งทางถนนมีความปลอดภัย (จำนวน ๑๐ แผนงาน/โครงการ)								
การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน								
๒๐	โครงการตรวจสอบกำกับ และดูแล การดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. รวบรวมข้อมูล ผลการตรวจสอบที่ผ่านมา ข้อร้องเรียน และสถิติ การรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานขนส่ง กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๕ และสำนักงานขนส่งจังหวัด ทุกจังหวัด และสถิติ การตรวจสภาพรถ จากสถานตรวจสภาพรถ ทั่วประเทศ ๒. จัดทำแผนงานและกำหนด แนวทางในการตรวจสอบ ๓. ดำเนินการตรวจสอบ สถานตรวจสภาพรถ จำนวน ๒๕๐ แห่ง (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘)	เป็นไปตามแผน ๑. รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบ ที่ผ่านมา ข้อร้องเรียนและสถิติ ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑-๕ และสำนักงานขนส่งจังหวัด ทุกจังหวัด และสถิติการตรวจสภาพรถ จากสถานตรวจสภาพรถทั่วประเทศ ๒. จัดทำแผนงานและกำหนดแนวทาง ในการตรวจสอบ ๓. ออกตรวจสอบสถานตรวจสภาพรถ จำนวน ๒๓๗ แห่ง พบข้อบกพร่อง จำนวน ๔๘ แห่ง โดยได้ดำเนินการ ระงับการดำเนินการตรวจสภาพรถ ชั่วคราว จำนวน ๒๗ แห่ง และ ตักเตือนครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๑ แห่ง	๕๒.๙๒	<b>งบ กปถ.</b> ๑,๐๔๖,๑๖๐	๓๖๘,๙๑๐	-

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเงื้องาน/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
๒๑	โครงการตรวจเข้มขั้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทาง ด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘	๑. จัดทำหนังสือชักชวน การปฏิบัติงาน และตัดโอนเงิน ค่าใช้จ่ายส่งให้ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำ ระบบการรายงาน ผลการปฏิบัติงาน จุดตรวจ ๒. สำนักงานขนส่งจังหวัด (สขจ.) ที่เป็นที่ตั้งของจุดตรวจ ดำเนินการจัดจ้างลูกจ้าง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำแต่ละจุด ไม่น้อยกว่า ๒ คนต่อผลัด รวม ๓ ผลัด หรือ ตามความเหมาะสม ของพื้นที่ ระยะเวลาจ้าง ไม่เกินคนละ ๑๒ เดือน ๓. ปฏิบัติการตั้งจุดตรวจฯ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย ของรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถทุกวัน ๔. รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นประจำทุกวัน โดย รายงานผ่านระบบรายงาน การตรวจสอบความปลอดภัยฯ ที่กำหนด และสำนัก สวัสดิภาพการขนส่งทางบก รวบรวมรายงาน ผลการปฏิบัติงานนำเสนอ ผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการ (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)	เป็นไปตามแผน ๑. จัดทำหนังสือชักชวน การปฏิบัติงาน และตัดโอนเงิน ค่าใช้จ่ายส่งให้ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำ ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจภายนอกสถานีฯ ๒. ตั้งจุดตรวจ Checking Point จำนวน ๒๘ แห่ง ใน ๒๖ จังหวัด ประกอบด้วย จุดตั้งอยู่ภายนอกสถานี ขนส่งผู้โดยสาร จำนวน ๒๑ จุด และจุดที่ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร จำนวน ๗ จุด - ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสาร สาธารณะ จำนวน ๓๐๔,๕๖๕ คัน พบรถที่เป็นไปตามเงื่อนไข จำนวน ๓๐๔,๔๙๖ คัน และรถบกพร่อง จำนวน ๖๙ คัน - ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถ จำนวน ๓๐๔,๕๖๓ คน พบพนักงานขับรถที่มีความพร้อม จำนวน ๓๐๔,๕๖๑ คน และ พนักงานขับรถบกพร่อง จำนวน ๒ คน - อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจาก รถโดยสารสาธารณะ จำนวน ๕๒ ครั้ง ๔. หน่วยปฏิบัติส่งรายงาน ผลการปฏิบัติงานประจำวัน ผ่านระบบรายงานตามที่กำหนด	๒๔.๐๐	งบ กปอ. ๕๕,๘๘๘,๐๘๘	๕๕,๘๘๘,๐๘๘	-

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
๒๒	โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. กำหนดแนวทางการดำเนินการ พร้อมแจ้งเวียนให้สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๕, (สขพ. ๑-๕) สำนักงานขนส่งจังหวัด (สขจ.) และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา (สขช.) ทราบและดำเนินการ ๒. แจ้งสำนักบริหารการคลังและรายได้ (สนร.) โอนเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ส่วนภูมิภาค ๓. หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดการอบรมนักเรียน/นักศึกษา ณ สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ หรือ ณ สถานที่ที่ สขพ. ๑-๕, สขจ. หรือ สขช. ทั่วประเทศ พิจารณาว่ามีความเหมาะสม (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๘)	เป็นไปตามแผน ๑. จัดทำหนังสือชักซ้อมแนวทางการดำเนินการ พร้อมแจ้งเวียนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการ ๒. จัดทำหนังสือแจ้ง สนร. โอนเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ส่วนภูมิภาค และแจ้งวงเงินที่ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ สขพ. ๑ - ๕ ๓. หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ	๓๓.๕๗	งบ กปถ. ๓๗,๘๗๓,๔๕๐	๓๗,๕๕๕,๑๙๗	-
๒๓	โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ดำเนินการระหว่างเดือน พ.ย. ๖๗ - ม.ค. ๖๘)	เป็นไปตามแผน ๑. ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการโครงการรณรงค์ฯ (ภาพรวม) ๒. แจ้งแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยแบ่งเป็น ๓ ช่วง คือ - ช่วงก่อนเทศกาล ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗	๓๐.๐๐	งบ กปถ. ๖๗,๙๖๘,๗๐๐	๖๑,๐๑๔,๐๔๐	-

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
				<p>- ช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗-๒ มกราคม ๒๕๖๘</p> <p>- ช่วงหลังเทศกาล ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ มกราคม ๒๕๖๘</p> <p>๓. แผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เพิ่มเติม) ดำเนินการตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากเดิมระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ เป็น ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๘</p> <p>๔. แจกโอนเงินสำหรับดำเนินโครงการรณรงค์ฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>				
๒๔	โครงการตรวจสอบ ติดตาม และกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงเรียนสอนขับรถใน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. จัดทำแผนและกำหนดแนวทางในการตรวจสอบจำนวน ๑ ครั้ง ๒. ดำเนินการตรวจสอบติดตาม และกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ตามแผนที่กำหนดจำนวน ๑ ครั้ง (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘)	<b>เป็นไปตามแผน</b> ๑. จัดทำแผนและกำหนดแนวทางในการตรวจสอบโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจาก ขบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. ออกตรวจสอบ ติดตาม และกำกับดูแลการดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจาก ขบ. จำนวน ๓ ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๕ แห่ง ดังนี้ - ส่วนกลาง ๒ ครั้ง จำนวน ๓ แห่ง (ไม่พบข้อบกพร่อง) - ส่วนภูมิภาค ๑ ครั้ง จำนวน ๒ แห่ง	๕๕.๐๐	<b>งบดำเนินงาน</b> ๗๐,๐๐๐	๒๕,๖๗๖	-

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข				
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง					
				(พบข้อบกพร่องและได้แจ้งให้โรงเรียน ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว)								
๒๕	โครงการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทางถนน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. การรวบรวมรายงาน อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจาก รถโดยสารสาธารณะและ รถบรรทุก โดยการจัดทำ สรุปรายงานการวิเคราะห์ อุบัติเหตุที่เกิดจากการชนส่ง ด้วยรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก เป็นประจำ ทุกเดือน ๒. ออกตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ณ ที่เกิดเหตุ กรณีอุบัติเหตุที่มีความรุนแรง เพื่อนำมาวิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดมาตรการ/แนวทาง ป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยการออกตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ณ ที่เกิดเหตุ และ เก็บข้อมูลตามจำนวนอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นจริง ร้อยละ ๑๐๐ (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	<b>เป็นไปตามแผน</b> ๑. จัดทำรายงานอุบัติเหตุทางถนน ที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะและ รถบรรทุก พร้อมทั้งสรุปสาเหตุ ของอุบัติเหตุ และนำเสนอแนวทาง หรือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗ ๒. ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ ที่เกิดเหตุ และเก็บข้อมูล ตามจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริง กรณีอุบัติเหตุรุนแรงฯ จำนวน ๗ ครั้ง (ครบตามจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริง) พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุและ มาตรการ/แนวทางป้องกัน ในภารกิจ/กิจกรรมการดำเนินงาน ของกรมการขนส่งทางบก	๖๒.๕๐	<b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b> วงเงินรวม : ๓๑๓,๘๔๐ <table border="1"> <tr> <td>งบ ดำเนินงาน</td> <td>๒๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบ กปถ.</td> <td>๒๙๓,๘๔๐</td> </tr> </table>	งบ ดำเนินงาน	๒๐,๐๐๐	งบ กปถ.	๒๙๓,๘๔๐	๘,๐๐๐	-
งบ ดำเนินงาน	๒๐,๐๐๐											
งบ กปถ.	๒๙๓,๘๔๐											
๒๖	โครงการกำกับดูแลผู้ตรวจและ ทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ ของรถใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กำหนดแผนการตรวจ ติดตามผู้ตรวจและ ทดสอบรถที่ใช้ก๊าซ เป็นเชื้อเพลิงครั้งแรก จำนวน ๑ ฉบับ (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	<b>เป็นไปตามแผน</b> - จัดทำแผนการตรวจติดตามครั้ง แรกแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง การ นำเสนอต่อผู้บริหาร	๑๐.๐๐	<b>งบดำเนินงาน</b> ๕๐,๐๐๐	-	-				

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
๒๗	โครงการประชุมผู้เชี่ยวชาญแห่งประเทศไทย	ม.ค.๖๘-มี.ค.๖๘	จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ แห่งประเทศไทย จำนวน ๑ ครั้ง (ดำเนินการระหว่างเดือน ม.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๘)	เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูล และเอกสารสำหรับการประชุม ผู้เชี่ยวชาญแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๐.๐๐	งบดำเนินงาน ๓๕,๐๐๐	-	-
๒๘	โครงการผลิตสื่อและนิทรรศการ ให้ความรู้สร้างเสริมจิตสำนึก ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. ผลิตสื่อส่งเสริม ความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน จำนวน ๑ สื่อ ๒. จัดนิทรรศการและกิจกรรม หรือเข้าร่วมนิทรรศการ ส่งเสริมความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน จำนวน ๓ ครั้ง (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	เป็นไปตามแผน ๑. จัดทำสื่อให้ความรู้และส่งเสริม ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ๒. จัดนิทรรศการ "มุมแห่งความปลอดภัย" จำนวน ๗ ครั้ง โดยเป็นงาน/กิจกรรม ของกรมการขนส่งทางบก จำนวน ๔ ครั้ง และหน่วยงานภายนอก จำนวน ๓ ครั้ง	๖๕.๘๓	งบดำเนินงาน ๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-
๒๙	โครงการติดตามและประเมินผล โครงการด้านความปลอดภัยทางถนน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ศึกษาข้อมูล วางแผน กำหนดแนวทาง และ ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่ เพื่อตรวจติดตาม ผลการดำเนินกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	เป็นไปตามแผน - กำหนดแนวทาง/วิธีการติดตาม และประเมินผลฯ (ครั้งที่ ๑) โดยคาดว่าจะดำเนินการผ่านระบบ การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย (Video Conference) โดยใช้โปรแกรม Zoom กับสำนักงานขนส่งจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘	๕.๐๐	งบดำเนินงาน ๓๐,๐๐๐	-	-
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๔ “สร้างมาตรฐานใหม่ตามสากล” เพื่อให้ระบบการขนส่งทางถนนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (จำนวน ๑ โครงการ)								
การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน								
๓๐	โครงการตรวจสอบมลพิษทางอากาศ และเสียงรบกวน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	การตรวจสอบมลพิษ ทางอากาศและเสียงในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน ๕๕๐ คัน (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	เป็นไปตามแผน ๑. จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ มลพิษทางอากาศและเสียงรบกวน ในสังกัดกระทรวงคมนาคม และ หน่วยงานที่เคยสังกัดกระทรวง คมนาคม รอบที่ ๑ ประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๖.๙๐	งบดำเนินงาน ๑๐,๐๐๐	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข				
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง					
				๒. ตรวจสอบมลพิษทางอากาศ และ เสี่ยงในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน ๘๐๗ คั่น (ผ่านเกณฑ์ การตรวจสอบ ๘๐๓ คั่น และ ตรวจไม่ผ่าน ๔ คั่น) ๓. รวบรวมผลการตรวจสอบมลพิษ รถราชการจากสำนักงานขนส่งจังหวัด ทั่วประเทศ โดยมีรถที่เข้ารับ การตรวจสอบ จำนวน ๓๐,๕๐๑ คั่น (ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ ๒๙,๖๗๘ คั่น ตรวจไม่ผ่าน ๘๒๓ คั่น)								
<b>แผนปฏิบัติการเรื่องที่ ๕ “ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น” เพื่อให้บริการที่เป็นเลิศและการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (จำนวน ๓๒ แผนงาน/โครงการ)</b>												
<b>การพัฒนาการให้บริการประชาชน (๑๙ โครงการ)</b>												
๓๑	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม (ทดแทน) (งบผูกพัน)	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ประกวดราคา (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการจัดทำแบบรูปและ รายการ	๒.๐๐	<b>งบลงทุน</b> วงเงินรวม : ๖๙,๙๐๕,๐๐๐ <table border="1"> <tr> <td>งบปี ๖๘</td> <td>๑๓,๙๘๑,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๙</td> <td>๕๕,๙๒๔,๐๐๐</td> </tr> </table>	งบปี ๖๘	๑๓,๙๘๑,๐๐๐	งบปี ๖๙	๕๕,๙๒๔,๐๐๐	-	การจัดทำแบบรูป และรายการมีความ ซับซ้อนและ รายละเอียด ค่อนข้างมาก ทำให้ การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน
งบปี ๖๘	๑๓,๙๘๑,๐๐๐											
งบปี ๖๙	๕๕,๙๒๔,๐๐๐											
๓๒	โครงการก่อสร้างสำนักงานขนส่ง จังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (ทดแทน) (งบผูกพัน)	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. ประกวดราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการจัดทำแบบรูปและ รายการ	๓.๐๐	<b>งบลงทุน</b> วงเงินรวม : ๕๗,๕๔๐,๐๐๐ <table border="1"> <tr> <td>งบปี ๖๘</td> <td>๑๑,๕๐๘,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๙</td> <td>๔๖,๐๓๒,๐๐๐</td> </tr> </table>	งบปี ๖๘	๑๑,๕๐๘,๐๐๐	งบปี ๖๙	๔๖,๐๓๒,๐๐๐	-	การจัดทำแบบรูป และรายการมีความ ซับซ้อนและ รายละเอียด ค่อนข้างมาก ทำให้ การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน
งบปี ๖๘	๑๑,๕๐๘,๐๐๐											
งบปี ๖๙	๔๖,๐๓๒,๐๐๐											

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข										
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง											
๓๓	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ขนส่งจังหวัดปัตตานี พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสุตะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี (ทดแทน) (งบผูกพัน)	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ประกวดราคา (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการจัดทำแบบรูปและ รายการ	๒.๐๐	<b>งบลงทุน</b> วงเงินรวม : ๗๔,๖๕๐,๐๐๐ <table border="1"> <tr> <td>งปี ๖๘</td> <td>๑๔,๙๓๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>งปี ๖๙</td> <td>๕๙,๗๒๐,๐๐๐</td> </tr> </table>	งปี ๖๘	๑๔,๙๓๐,๐๐๐	งปี ๖๙	๕๙,๗๒๐,๐๐๐	-	การจัดทำแบบรูป และรายการมีความ ซับซ้อนและ รายละเอียด ค่อนข้างมาก ทำให้ การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน						
งปี ๖๘	๑๔,๙๓๐,๐๐๐																	
งปี ๖๙	๕๙,๗๒๐,๐๐๐																	
๓๔	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานขนส่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๒ พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (งบผูกพัน)	ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๘ (ยกเลิกสัญญาเดิม)	ดำเนินการก่อสร้างสะสม ร้อยละ ๑๐๐ (ตามแผน การก่อสร้าง ปี ๒๕๖๘) (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	ไม่เป็นไปตามแผน - ลงนามสัญญาจ้างบริษัท พรหมโยธการ ระยอง(1993)จำกัดเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๘๐.๓๗ ล้านบาท ระยะเวลา ๔๕๐ วัน เริ่มสัญญา วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด สัญญาวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพิจารณา แก้ไขแบบก่อสร้างให้มีความเหมาะสม กับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้ง การพิจารณาปรับลดค่าปรับ ของอาคารสำนักงาน และติดตั้ง เพอร์นิเจอร์ของอาคารที่พักอาศัย - เนื่องจากมีความคืบหน้า ร้อยละ ๙๑.๙๖	๘๘.๐๐	<b>งบลงทุน</b> วงเงินรวม : ๑๑๐,๕๒๗,๗๐๐.๐๐ <table border="1"> <tr> <td>งปี ๖๒-๖๕</td> <td>๓๗,๕๓๒,๑๐๐</td> </tr> <tr> <td>งปี ๖๖</td> <td>๕๐,๐๒๒,๙๐๐</td> </tr> <tr> <td>งปี ๖๗</td> <td>๓,๐๒๔,๗๐๐</td> </tr> <tr> <td>งปี ๖๘</td> <td>๑๙,๙๔๘,๐๐๐</td> </tr> </table>	งปี ๖๒-๖๕	๓๗,๕๓๒,๑๐๐	งปี ๖๖	๕๐,๐๒๒,๙๐๐	งปี ๖๗	๓,๐๒๔,๗๐๐	งปี ๖๘	๑๙,๙๔๘,๐๐๐	๕๒,๘๓๙,๖๙๖	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ อยู่ระหว่าง การพิจารณาแก้ไข แบบก่อสร้าง ให้มีความเหมาะสม กับสภาพพื้นที่ ก่อสร้าง ทำให้ ต้องหยุดงานก่อสร้าง ชั่วคราว		
งปี ๖๒-๖๕	๓๗,๕๓๒,๑๐๐																	
งปี ๖๖	๕๐,๐๒๒,๙๐๐																	
งปี ๖๗	๓,๐๒๔,๗๐๐																	
งปี ๖๘	๑๙,๙๔๘,๐๐๐																	
๓๕	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ข้าราชการ ขนาด ๑๒ หน่วย พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานขนส่ง จังหวัดระยอง สาขาอำเภอแกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (งบผูกพัน)	ต.ค.๖๓-มิ.ย.๖๘ (ยกเลิกสัญญาเดิม)	๑. ประกวดราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐.๐๐	<b>งบลงทุน</b> วงเงินรวม : ๑๖,๙๘๘,๘๐๐ <table border="1"> <tr> <td>งปี ๖๔</td> <td>๔,๐๐๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>งปี ๖๕</td> <td>๕,๒๖๓,๑๐๐</td> </tr> <tr> <td>งปี ๖๖</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>งปี ๖๗</td> <td>๕,๔๑๕,๒๐๐</td> </tr> <tr> <td>งปี ๖๘</td> <td>๒,๓๑๐,๕๐๐</td> </tr> </table>	งปี ๖๔	๔,๐๐๐,๐๐๐	งปี ๖๕	๕,๒๖๓,๑๐๐	งปี ๖๖	-	งปี ๖๗	๕,๔๑๕,๒๐๐	งปี ๖๘	๒,๓๑๐,๕๐๐	-	กระบวนการจัดจ้าง ใช้ระยะเวลา มากกว่าที่คาด ทำให้ การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน
งปี ๖๔	๔,๐๐๐,๐๐๐																	
งปี ๖๕	๕,๒๖๓,๑๐๐																	
งปี ๖๖	-																	
งปี ๖๗	๕,๔๑๕,๒๐๐																	
งปี ๖๘	๒,๓๑๐,๕๐๐																	

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข						
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง							
๓๖	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร ๔ กรมการขนส่งทางบก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (งบบุคลากร)	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ดำเนินการปรับปรุงระบบ ร้อยละ ๑๐ (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	เป็นไปตามแผน - ลงนามสัญญาจ้าง การไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร ๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ วงเงิน ๒๓.๓๓ ล้านบาท ระยะเวลา ๕๐๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการปรับปรุง ระบบไฟฟ้า อาคาร ๔ - มีความคืบหน้า ร้อยละ ๑๐	๒๕.๐๐	<b>งบลงทุน</b> วงเงินรวม : ๒๓,๓๓๒,๐๐๐ <table border="1"> <tr> <td>งปี ๖๗</td> <td>๓,๔๙๙,๘๐๐</td> </tr> <tr> <td>งปี ๖๘</td> <td>๑๒,๓๔๙,๙๐๐</td> </tr> <tr> <td>งปี ๖๙</td> <td>๗,๔๘๒,๓๐๐</td> </tr> </table>	งปี ๖๗	๓,๔๙๙,๘๐๐	งปี ๖๘	๑๒,๓๔๙,๙๐๐	งปี ๖๙	๗,๔๘๒,๓๐๐	-	-
งปี ๖๗	๓,๔๙๙,๘๐๐													
งปี ๖๘	๑๒,๓๔๙,๙๐๐													
งปี ๖๙	๗,๔๘๒,๓๐๐													
๓๗	โครงการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า สำนักงานขนส่งจังหวัด ๒๘ แห่ง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. ประกวราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างเตรียมการปรับปรุง หม้อแปลงไฟฟ้า	๑๕.๐๐	<b>งบลงทุน</b> ๕๖,๖๐๐,๐๐๐	-	-						
๓๘	โครงการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอ ๕๒ แห่ง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. ประกวราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างเตรียมการปรับปรุง หม้อแปลงไฟฟ้า	๑๕.๐๐	<b>งบลงทุน</b> ๙๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-						
๓๙	โครงการปรับปรุงอาคารชั้นที่ ๑, ๒ และหลังคาอาคาร สำนักงานขนส่ง กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. ประกวราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดจ้าง	๕.๐๐	<b>งบลงทุน</b> ๑๕,๖๔๓,๐๐๐	-	การจัดทำแบบรูป และรายการ มีรายละเอียด ค่อนข้างมาก ทำให้ การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน						
๔๐	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. ประกวราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๘.๐๐	<b>งบลงทุน</b> ๑๑,๒๗๕,๔๐๐	-	ขั้นตอนการ ประกวดราคา ใช้ระยะเวลามาก ทำให้การ ดำเนินการไม่เป็นไป ตามแผน						

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
๔๑	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ข้าราชการ ขนาด ๑๖ หน่วย พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์ทดสอบ ยานยนต์ จังหวัดปทุมธานี (งบผูกพัน)	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. ประกวดราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการจัดทำแบบรูปและ รายการ	๓.๐๐	<b>งบลงทุน</b> วงเงินรวม : ๔๒,๗๖๐,๐๐๐ งบปี ๖๘ ๘,๕๕๒,๐๐๐ งบปี ๖๙ ๓๔,๒๐๘,๐๐๐	-	การจัดทำแบบรูป และรายการมีความ ซับซ้อนและ รายละเอียด ค่อนข้างมาก ทำให้ การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน
๔๒	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ แขวงท่าข้าม เขตบางขุน เทียน กรุงเทพมหานคร	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. ประกวดราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดจ้าง	๕.๐๐	<b>งบลงทุน</b> ๑๘,๗๑๙,๐๐๐	-	การจัดทำแบบรูป และรายการ มีรายละเอียด ค่อนข้างมาก ทำให้ การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน
๔๓	โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (บ้านแฝด) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๕ แห่ง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. ประกวดราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการจัดทำแบบรูปและ รายการ	๕.๐๐	<b>งบลงทุน</b> ๔๕,๒๒๐,๐๐๐	-	การจัดทำแบบรูป และรายการมีความ ซับซ้อนและ รายละเอียด ค่อนข้างมาก ทำให้ การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน
๔๔	โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานขนส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. ประกวดราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้างรั้ว	๑๕.๐๐	<b>งบลงทุน</b> ๑๐,๙๖๓,๐๐๐	-	-
๔๕	โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ๙ แห่ง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. ประกวดราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างเตรียมการปรับปรุง อาคารที่พักอาศัย	๑๕.๐๐	<b>งบลงทุน</b> ๒๘,๗๑๗,๗๐๐	-	-
๔๖	โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงาน ขนส่งจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. ประกวดราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างเตรียมการปรับปรุง อาคารที่พักอาศัย	๑๕.๐๐	<b>งบลงทุน</b> ๑๑,๐๙๙,๐๐๐	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข				
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง					
๔๗	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด ๓๒ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร (งบผูกพัน)	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๙	๑. ประกวดราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการจัดทำแบบรูปและรายการ	๓.๐๐	<b>งบลงทุน</b> วงเงินรวม : ๔๔,๖๕๐,๐๐๐ <table border="1"> <tr> <td>งบปี ๖๘</td> <td>๘,๙๓๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๙</td> <td>๓๕,๗๒๐,๐๐๐</td> </tr> </table>	งบปี ๖๘	๘,๙๓๐,๐๐๐	งบปี ๖๙	๓๕,๗๒๐,๐๐๐	-	การจัดทำแบบรูปและรายการมีความซับซ้อนและรายละเอียดค่อนข้างมาก ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน
งบปี ๖๘	๘,๙๓๐,๐๐๐											
งบปี ๖๙	๓๕,๗๒๐,๐๐๐											
๔๘	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ๓๐ แห่ง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. ประกวดราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างเตรียมการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย	๑๕.๐๐	<b>งบลงทุน</b> ๘๘,๔๘๗,๔๐๐	-	-				
๔๙	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานขนส่งสาขา ๕ แห่ง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. ประกวดราคา ๒. ทำสัญญาจ้างเหมา (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้าง	๑๕.๐๐	<b>งบลงทุน</b> ๑๐,๗๐๐,๐๐๐	-	-				
การพัฒนาบุคลากรของกรมการขนส่งทางบก (๖ โครงการ)												
๕๐	แผนพัฒนาบุคลากรกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง ๒. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ๓. การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ๔. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร "ฉันทคือ...ข้าราชการที่ดี" จำนวน ๒ รุ่น (รุ่นที่ ๘๐ - ๘๑) มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๕๕ คน ๕. การส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนากับหน่วยงานภายนอก	เป็นไปตามแผน กิจกรรมที่ ๒ : การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน ๑ ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๓๙๒ คน กิจกรรมที่ ๓ : การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานจำนวน ๑ ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๔๖๙ คน กิจกรรมที่ ๔ : การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร "ฉันทคือ...ข้าราชการที่ดี" จำนวน ๒ รุ่น (รุ่นที่ ๘๐ - ๘๑) มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๕๕ คน กิจกรรมที่ ๕ : การส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนากับหน่วยงานภายนอก	๑๔.๘๕	<b>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b> วงเงินรวม : ๙,๖๒๙,๗๐๐ <table border="1"> <tr> <td>งบดำเนินงาน</td> <td>๘,๐๐๐,๐๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบก.บ.</td> <td>๑,๖๒๙,๗๐๐</td> </tr> </table>	งบดำเนินงาน	๘,๐๐๐,๐๐๐	งบก.บ.	๑,๖๒๙,๗๐๐	๙๙๓,๖๐๐	-
งบดำเนินงาน	๘,๐๐๐,๐๐๐											
งบก.บ.	๑,๖๒๙,๗๐๐											

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
			๕. การส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนากับหน่วยงานภายนอก ไม่น้อยกว่า ๓๐ ครั้ง ๖. การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ หลักสูตร (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนบุคลากร) ๗. การเสริมสร้างวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)	จำนวน ๙ ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๙ คน				
๕๑	โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมการขนส่งทางบก และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์แผนรายปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	รวบรวม ประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติการราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และนำเข้าข้อมูลผ่านระบบ eMENSOCR ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จำนวน ๑ ฉบับ/ครั้ง (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	เป็นไปตามแผน - จัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติการราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ ขบ. และนำเข้าข้อมูลผ่านระบบ eMENSOCR ของ สศช. จำนวน ๑ ฉบับ/ครั้ง เรียบร้อยแล้ว	๒๐.๐๐	<u>งบดำเนินงาน</u> ๑๓๘,๐๐๐	๑๐,๕๑๕	-
๕๒	แผนงานพัฒนาระบบราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เป็นไปตามแผน ๑. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ ขบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน ส่งให้กระทรวงคมนาคม ๒. รับฟังคำชี้แจงแนวทางการประเมิน	๖๐.๐๐	<u>งบดำเนินงาน</u> ๑๓,๐๐๐	๑,๕๐๐	-

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
			จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อมูล และรายงานผล จำนวน ๑ รายงาน ๒. รับฟังคำชี้แจง แนวทางการประเมิน ส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน ๑ ครั้ง ๓.หารือร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ รายละเอียดตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการเพื่อเป็นกรอบ ในการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการของ ขบ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ครั้ง ๔. จัดประชุม คณะกรรมการพิจารณา กำหนดแนวทาง การดำเนินงาน ตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ	ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงาน ก.พ.ร. และเข้าร่วม การประชุมชี้แจงแนวทาง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ ๓.หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการฯ ๔. จัดทำหนังสือข้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการฯ				

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
			ราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง/ ทำหนังสือขอกซ์ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินการ ตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการของ ขบ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ครั้ง (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)					
๕๓	แผนการดำเนินการเสนอขอรับรางวัล ของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	แจ้งหลักเกณฑ์เบื้องต้น ในการเสนอขอรับรางวัล ให้หน่วยงานทราบ เพื่อให้ หน่วยงานเตรียมพิจารณา ผลงานที่มีความพร้อมและ เหมาะสมในการเสนอ ขอรับรางวัล จำนวน ๑ ฉบับ (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘)	เป็นไปตามแผน - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้แทน กรมการขนส่งทางบก เข้าร่วม การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัคร และหลักเกณฑ์การพิจารณา รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ และ Facebook ของสำนักงาน ก.พ.ร.	-	<u>งบดำเนินงาน</u> ๑๑,๐๐๐.๐๐	-	-
๕๔	แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	๑. จัดอบรม/ สัมมนา เชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้แก่คณะทำงานพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (Working Team) และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน ๖ ครั้ง ๒. จัดประชุมเตรียมความพร้อม การตรวจประเมินรางวัล ณพื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) จำนวน ๑ ครั้ง (ดำเนินการระหว่างเดือน ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘)	เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลสำหรับ การประเมินสถานะการเป็นระบบ ราชการ ๔.๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	<u>งบดำเนินงาน</u> ๒๒๒,๐๐๐	-	-

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข						
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง							
๕๕	โครงการพัฒนางานบริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของกรมการขนส่งทางบกสู่ดิจิทัล	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	จัดประชุมคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนานวัตกรรมและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัล/คณะทำงานย่อยเพื่อขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกระบวนการงานให้เป็นดิจิทัลเพื่อทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่มือสำหรับประชาชนของกรมการขนส่งทางบกและวางแผนรูปแบบงานบริการเป็นดิจิทัลต่อไปจำนวน ๒ ครั้ง (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘)	เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลและหารือร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมจัดประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกระบวนการงานให้เป็นดิจิทัล	-	งบดำเนินงาน ๑๑,๒๐๐.๐๐	-	-						
การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๗ โครงการ)														
๕๖	โครงการพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตขับรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและรองรับการพัฒนาไปสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ (งบผูกพัน)	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๑ ฉบับ ๒. ดำเนินการจัดจ้างและลงนามในสัญญา จำนวน ๑ ฉบับ (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐.๐๐	งบลงทุน วงเงินรวม : ๒๑๒,๐๒๗,๓๐๐ <table border="1"> <tr> <td>งบปี ๖๗</td> <td>๓๑,๘๐๔,๑๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๘</td> <td>๕๗,๒๑๕,๑๐๐</td> </tr> <tr> <td>งบปี ๖๙</td> <td>๑๒๓,๐๐๘,๑๐๐</td> </tr> </table>	งบปี ๖๗	๓๑,๘๐๔,๑๐๐	งบปี ๖๘	๕๗,๒๑๕,๑๐๐	งบปี ๖๙	๑๒๓,๐๐๘,๑๐๐	-	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน
งบปี ๖๗	๓๑,๘๐๔,๑๐๐													
งบปี ๖๘	๕๗,๒๑๕,๑๐๐													
งบปี ๖๙	๑๒๓,๐๐๘,๑๐๐													
๕๗	โครงการพัฒนาระบบบริการทางทะเบียนรถรูปแบบดิจิทัล แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๑ ฉบับ (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำร่าง TOR และทบทวนราคากลาง	๕.๐๐	งบลงทุน ๖๒,๕๐๐,๐๐๐	-	ขั้นตอนการจัดทำร่าง TOR และราคากลางมีรายละเอียดมาก ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน						

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
๕๘	โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัลของกรมการขนส่งทางบก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ดำเนินการจัดจ้างและลงนามในสัญญา จำนวน ๑ ฉบับ (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘)	เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐.๐๐	งบลงทุน ๓๙,๙๘๕,๐๐๐	-	-
๕๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ กรมการขนส่งทางบก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ดำเนินการจัดจ้างและลงนามในสัญญา จำนวน ๑ ฉบับ (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕.๐๐	งบลงทุน ๑๔,๙๗๗,๖๐๐	-	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน
๖๐	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมการขนส่งทางบก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ดำเนินการจัดจ้างและลงนามในสัญญา จำนวน ๑ ฉบับ (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐.๐๐	งบลงทุน ๕๘,๖๖๖,๖๐๐	-	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน
๖๑	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Passbook ทดแทนเครื่องพิมพ์เครื่องเก่าและเพิ่มเติม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๘๘ เครื่อง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ดำเนินการจัดจ้างและลงนามในสัญญา จำนวน ๑ ฉบับ (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐.๐๐	งบลงทุน ๒๙,๔๐๐,๐๐๐	-	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			งบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของเนื้อหา/ เป้าหมาย	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายจริง	
๖๒	โครงการจัดหาระบบป้องกันไฟฟ้ากระชอก ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ของสำนักงานขนส่ง ระยะที่ ๔ จำนวน ๔๓ แห่ง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑. การกำหนดร่างขอบเขต ของงาน (TOR) และเอกสาร ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ดำเนินการจัดจ้างและลงนาม ในสัญญา จำนวน ๑ ฉบับ (ภายในเดือน ธ.ค. ๖๗)	ไม่เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๕.๐๐	งบลงทุน ๑๗,๑๑๔,๐๐๐	-	การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างมีความล่าช้า กว่ากำหนด ส่งผลให้ การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน
